


Sanierung Waldhöhenfreibad

Projektbericht 2 / 2023



Gefördert
durch:

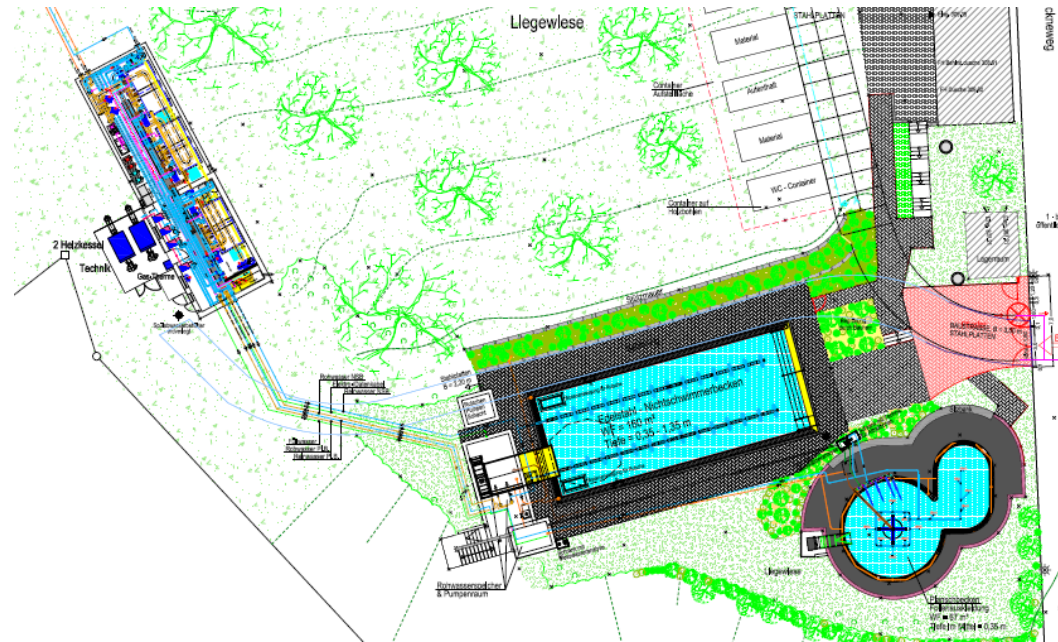

Projektübersicht

Bauzeit	
	Überschritten
	In Verzug (max. 6 Wo.)
	Im Plan

Kosten	
	Kostenberechnung überschritten
	Kostenberechnung eingehalten (± 5%)
	Kostenberechnung unterschritten

Qualität	
	Gravierende Mängel
	Geringe Mängel
	Keine Mängel

Projektstand

- Baumaßnahmen bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen
- Einweihung / Wiederinbetriebnahme am 13.05.2023 erfolgt
- Abnahme der Technik unter Volllast im Juli 2023
- Schlussrechnungsprüfung nach Schlussabnahme

Kostenkontrolle

	Kostenberechnung 2019	HH-Ansatz 2023	Kostenanschlag	Kostenprognose	Kosten- feststellung
	€	€	€	€	€
Aufwendungen:			1	2	3
Baukosten / Abbruch / Baunebenkosten / Außenanlagen	2.358.000 62%	3.800.000 100%	3.450.000 91%	3.600.000 95%	3.800.000 100%
Erträge:					
Zuweisungen v. Bund	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%

¹ Vergabesumme inkl. Nachträge
² Vergabesumme inkl. Nachträge und noch nicht vergebene Leistungen lt. Kostenberechnung
³ geprüfte Schlussrechnungen (Beträge werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium übernommen)
