


Dickne Brücke

Projektbericht Stand: 30.09.2020



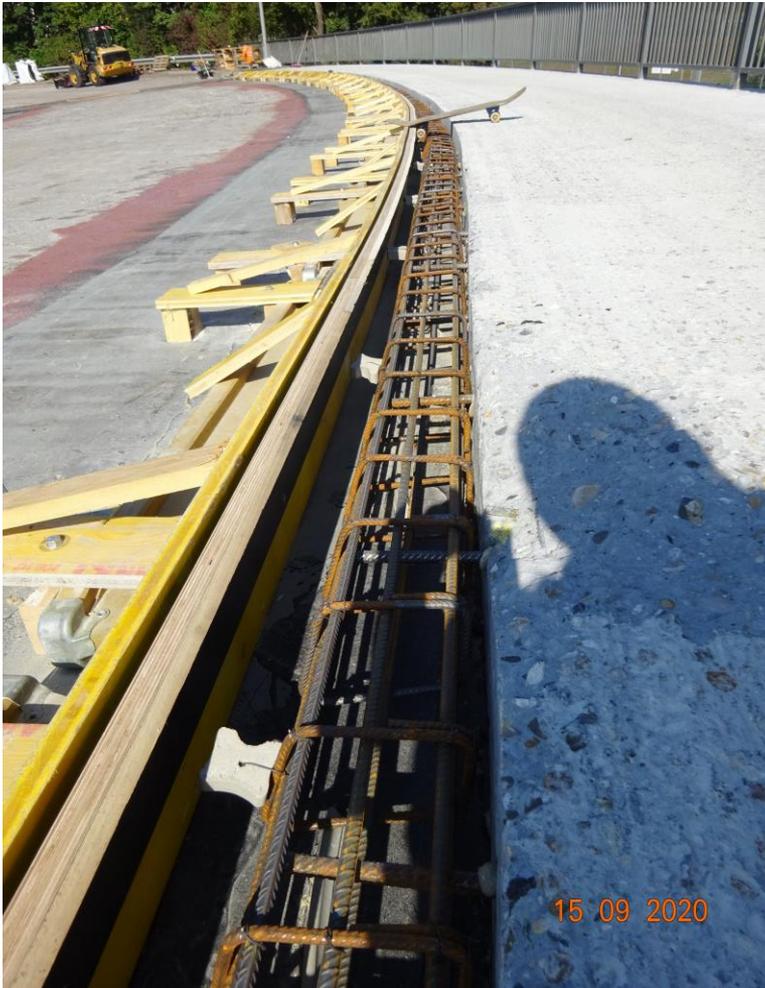


Bewehrung Schrammbord



Vorbereitende Arbeiten für Epoxidharzbeschichtung



Fertige Beschichtung und fertige Schrammborde

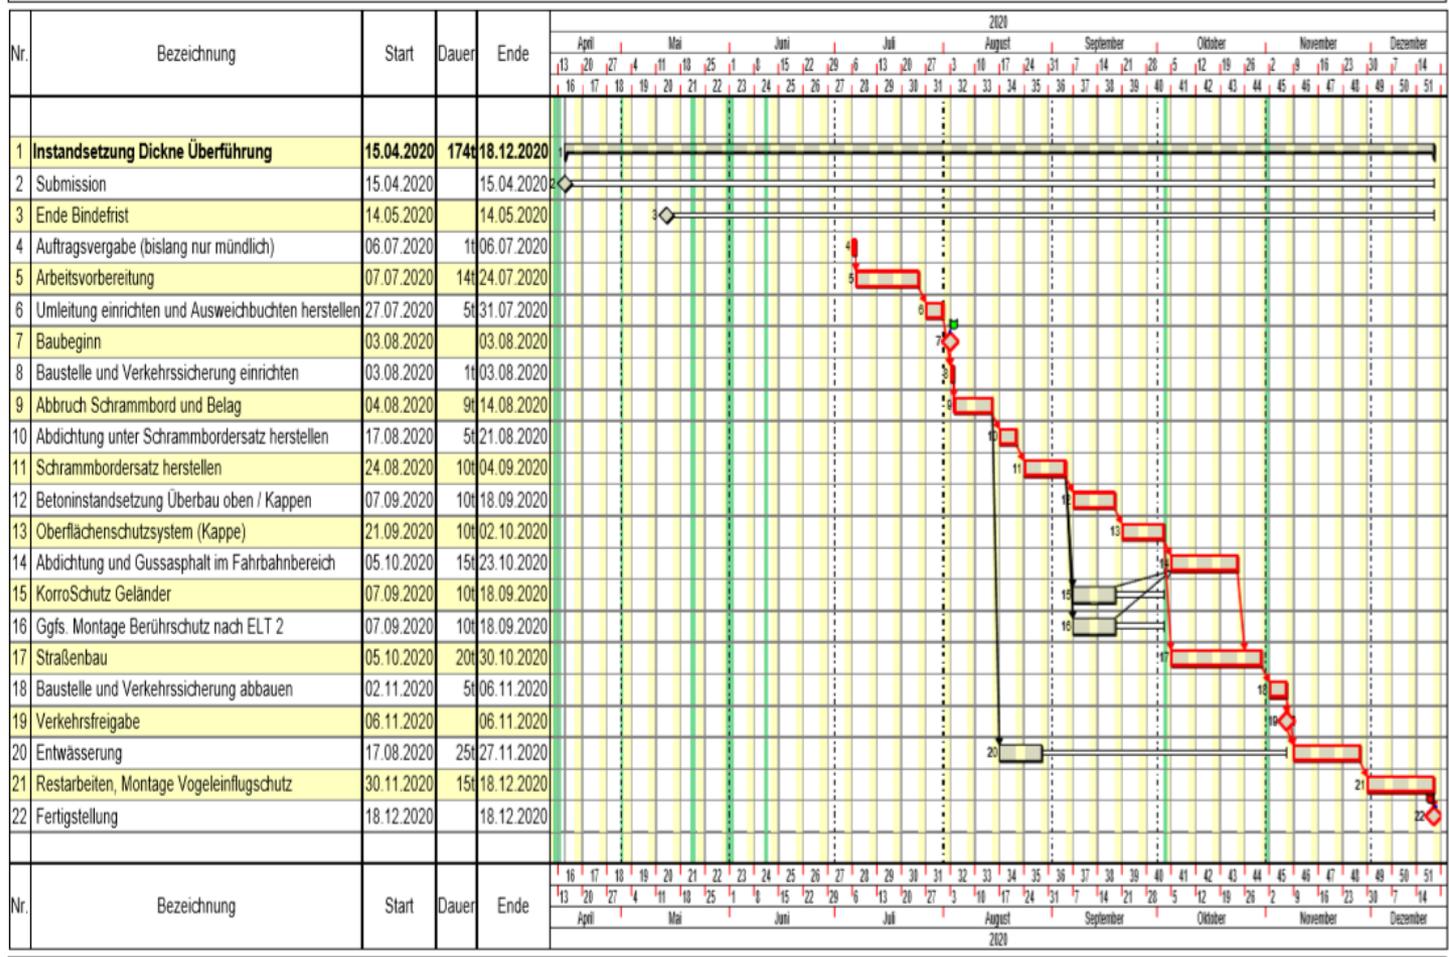



oz	Kurztext	Gesamtbetrag	GB (VA)
01	INSTANDSETZUNG	947.409,63	957.409,57
1.	ALGEMEINER TEIL	73.868,40	74.387,60
1. 1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	54.258,21	54.777,41
1. 2.	TECHNISCHE BEARBEITUNG	11.626,26	11.626,26
1. 3.	VERMESSUNG, BEWEISSICHERUNG	7.983,93	7.983,93
2.	VERKEHRSSICHERUNG	23.110,25	23.092,80
2. 1.	VERKEHRSSLEITEINRICHTUNGEN	23.110,25	23.092,80
3.	ERD- U. LANDSCHAFTSBAU	12.843,51	13.660,66
3. 1.	VORARBEITEN	12.843,51	13.660,66
4.	BETON, STAHLBETON, MAUERWERK	251.604,31	236.615,96
4. 1.	ARBEITS-/TRAGGERÜSTE	33.830,06	33.830,06
4. 2.	BETONABBRUCH	27.024,75	51.509,79
4. 3.	BETON	29.421,70	29.421,70
4. 4.	BETONSTAHL, SPANNSTAHL	12.000,04	11.403,70
4. 5.	BETONINSTANDSETZUNG	121.409,11	82.532,06
4. 6.	OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME	27.918,65	27.918,65
5.	STAHLBAUARBEITEN	138.854,13	128.550,79
5. 1.	ÜKO, LAGER	3.466,68	989,04
5. 2.	BERÜHRUNGSSCHUTZ	127.458,35	127.458,35
5. 3.	GELÄNDER, SCHUTZPLANKEN	7.929,10	103,40

6.	ENTWÄSSERUNG, KORROSION, ABDICHTUNG	161.948,28	160.888,52
6. 1.	ENTWÄSSERUNG FÜR KUNSTBAUTEN	51.013,46	50.150,24
6. 2.	OBERFLÄCHEN U. KORROSIONSSCHUTZ	18.432,42	18.235,88
6. 3.	ABDICHTUNG U. FUGEN	92.502,40	92.502,40
7.	FAHRBAHNBELÄGE	71.550,60	111.990,60
7. 1.	ABBRUCH ASPHALTDECK. U. ABDICHT.	24.686,40	65.126,40
7. 2.	BITUMINÖSE DECKEN	46.864,20	46.864,20
8.	AUSSTATTUNG, SONSTIGES	22.026,98	21.626,42
8. 1.	VOGELINFLUGSCHUTZ	7.771,76	7.371,20
8. 2.	BÖSCHUNGSTREPPE	14.129,70	14.129,70
8. 3.	MESSBOLZEN	125,52	125,52
9.	STRASSENBAU	163.455,95	158.464,81
9. 1.	SCHICHTEN OHNE BINDEMittel	12.631,08	13.659,08
9. 2.	ASPHALTBAUWEISEN	134.058,74	128.194,16
9. 3.	PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN	10.912,24	10.785,88
9. 4.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	937,54	937,54
9. 5.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	4.916,35	4.888,15
10.	KONTROLLPRÜFUNGEN	1.610,44	1.594,63
10. 1.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN	1.610,44	1.594,63
11.	Nachträge	26.536,78	26.536,78
11. 1.	Planung senkrechter Berührungsschutz	14.842,53	14.842,53
11. 2.	Berührungsschutz ETL 2	11.694,25	11.694,25
