

Projektübersicht

Bauzeit	
	Überschritten
	In Verzug (max. 6 Wo.)
	Im Plan

Kosten	
	Kostenberechnung überschritten
	Kostenberechnung eingehalten ($\pm 5\%$)
	Kostenberechnung unterschritten

Qualität	
	Gravierende Mängel
	Geringe Mängel
	Keine Mängel

Projektstand

- Abbruch- und Demontearbeiten der Badetechnik / Filteranlage / Heizungstechnik / Elektro- und MSR-Technik erfolgt

Filtergebäude

- Fundamente für neuen Heizkessen und Filter erstellt
- Kernbohrungen für neue Leitungsführungen erstellt
- Wände gestrichen, Bodenbeschichtung aufgebracht
- Neue Filter aufgestellt, Beginn mit neuer Verrohrung

Heizraum

- Neue Heizkessel montiert
- Promatdecke eingebaut

Verrohrung im Außenbereich

- Erneuerung der Reinwasser- und Rohrwasserleitungen zwischen Technikgebäude und Rohwasserspeicher
- Verlegung Freispiegelleitung zur Spülwasserentwässerung

Nichtschwimmerbecken

- Entfernung Beckenkopf und alte Wassergewöhnungstreppe
- Kernbohrarbeiten für neue Leitungen sowie rohrseitige Anbindung des Beckens
- Auffütterung Beckenboden und Einbau Bodenkanäle
- Montage Edelstahlauskleidung
- Erstellung des Rutschenpumpenschachts

Planschbecken

- Abbruch Wasserpilz

Kostenkontrolle

	Kostenberechnung (HH-Ansatz 2020)	HH-Ansatz 2021	Kostenanschlag	Kostenprognose	Kosten- feststellung
	€	€	€	€	€
Aufwendungen:			¹	²	³
Baukosten / Abbruch / Baunebenkosten / Außenanlagen	2.358.000 84%	2.800.000 100%	2.800.000 100%	3.450.000 123%	3.450.000 123%
Erträge:					
Zuweisungen v. Bund	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%

¹ Vergabesumme inkl. Nachträge

² Vergabesumme inkl. Nachträge und noch nicht vergebene Leistungen lt. Kostenberechnung


³ geprüfte Schlussrechnungen (Beträge werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium übernommen)

Gefördert durch:



Aktueller Bauzeitenplan

Maßnahme	Baubeginn	Bauende
Planung- und Ausschreibung		bis Mai 2022
Abbruch- und Demontage (Badetechnik etc.)	Mai 2022	Juli 2022
Bauliche Aufarbeitung d. Technikgebäude	Juli 2022	August 2022
Folienauskleidung Planschbecken	Oktober 2022	November 2022
Bauliche Arbeiten NSB	August 2022	August 2022
Edelstahlauskleidung NSB	September 2022	Oktober 2022
Neumontage Badetechnik etc.	August 2022	März 2023
Herstellung unterer Eingang / Wiederaufbau Landschaftsanlage	Januar 2023	März 2023
Restarbeiten / Beckenfüllung	März 2023	März 2023
Testbetrieb / Abnahme / Einweisung	April 2023	April 2023
Wiedereröffnung	Anfang Mai 2023	

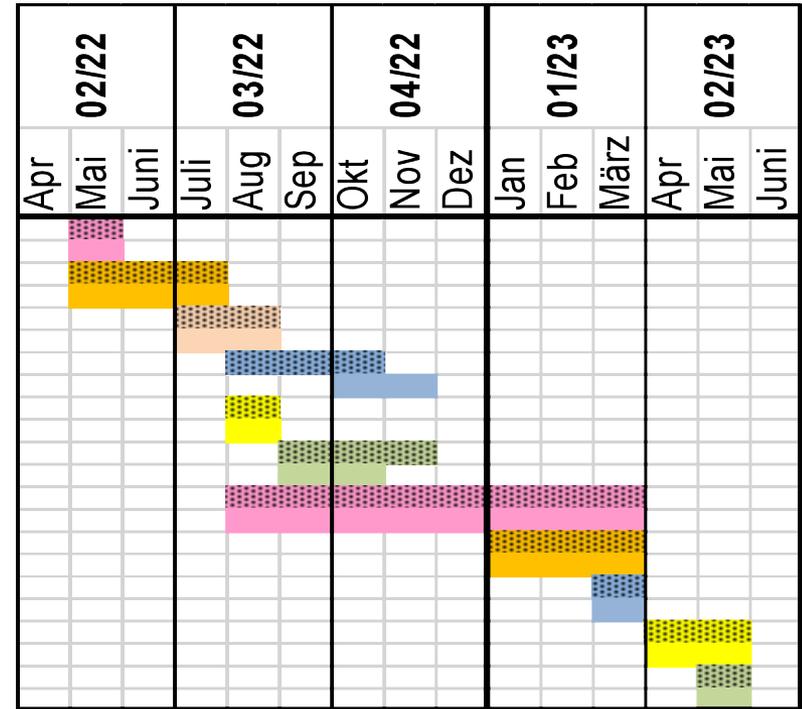

-  beschlossener Bauzeitenplan
-  aktualisierter Bauzeitenplan
