

Ausbauprogramm Diegelsberger Straße

Projektbericht Stand: 30.09.2020





Abschnitt ab Kreuzungsbereich Rechbergstraße



offener Kreuzungsbereich Rechbergstraße



Bereich neuer Schacht bei Diegelsberger Str. 33



Fußwegbereiche entlang Dickneweg


Baumaßnahmen Zeitplan

- Kanalschacht bei Diegelsberger Straße 33/35 setzen KW41
- Wasserleitung und Hausanschlüsse zw. Rechbergstr. und Diegelsberger Straße 35 verlegen KW42-43
- Gasleitung zw. Rechbergstr. und Diegelsberger Straße 35 einbauen KW43-44
- Notversorgung Gas und Wasser von Diegelsberger Straße 35 – Teckstraße einrichten KW45
- Kanalbau bis Teckstraße ab KW45-46

Bauzeitenplan Diegelsberger Straße, Ebersbach

Stand: 02.05.20

(Vorbehaltlich Witterung und Mehrleistungen etc.)

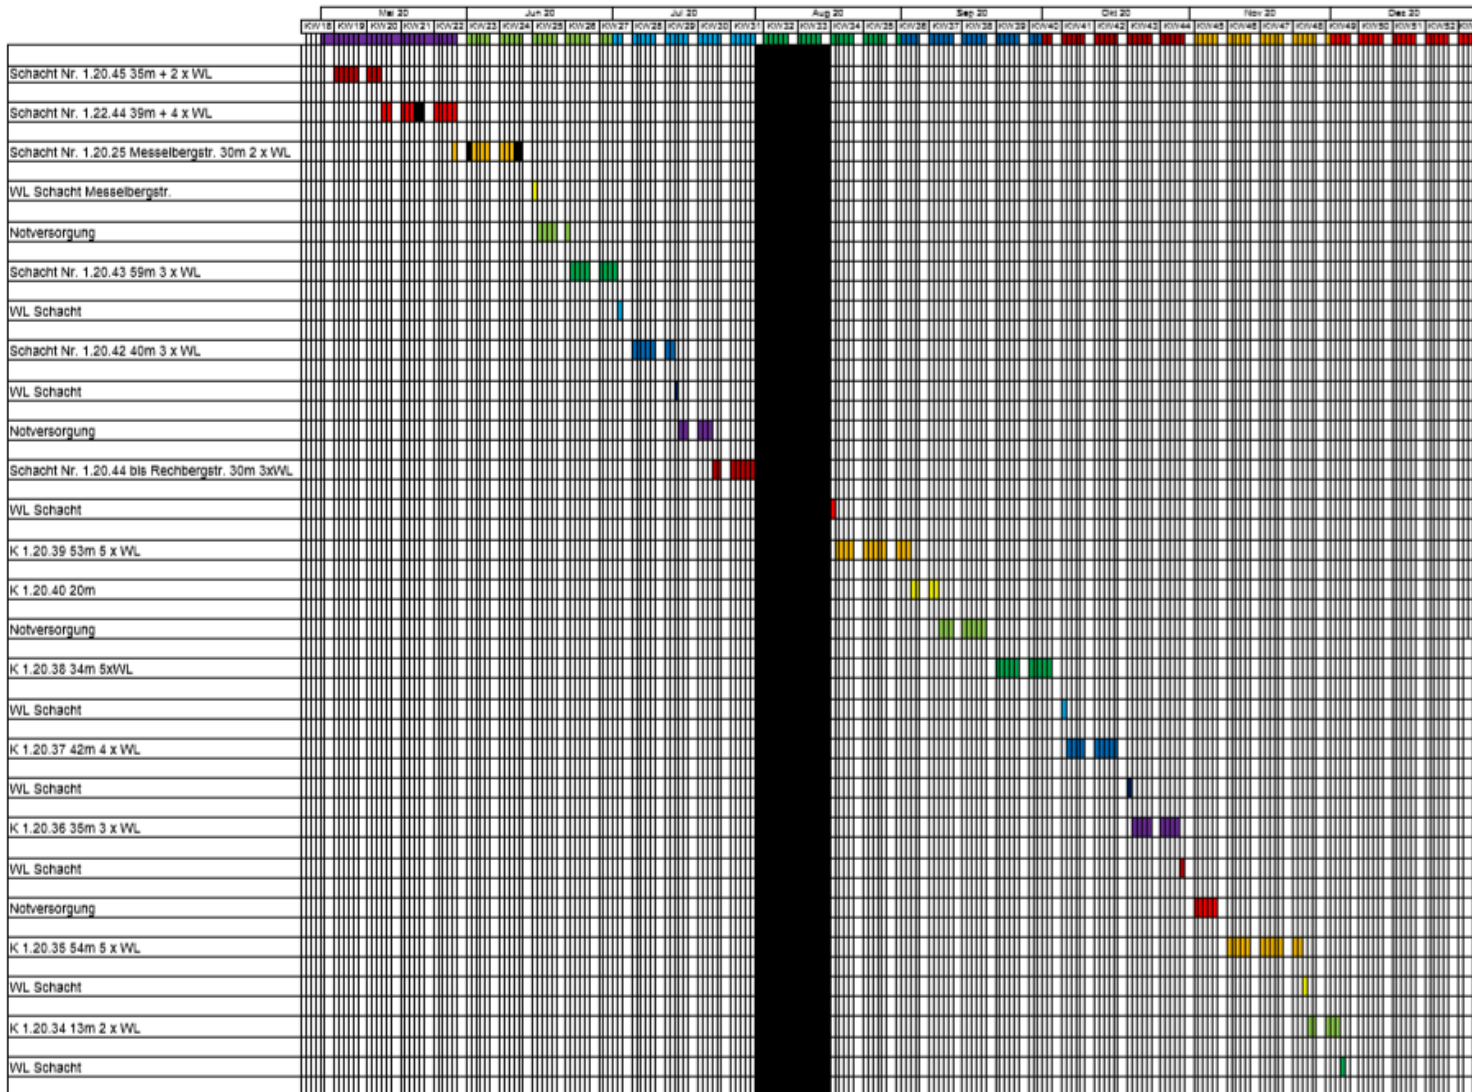

Ausbau der Diegelsberger Straße in Ebersbach/ F.
Fertigkeitsgrad

Gewerk	Straßenbau	Beleuchtung	Straßenbau Parkplatz	Kanalbau - Schmutzwasser	Kanalbau - Regenwasser	Wasserversorgung (Tiefbau)	Wasserversorgung (Verlege- u. Montagearbeiten.)	Wasserversorgung (Tiefbau)	Wasserversorgung (Verlege- u. Montagearbeiten.)	Gesamt Orte
Ort 1.1	70%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%
Ort 1.2	70%	50%	20%	100%		100%	100%	100%		77%
Ort 1.3.0	80%	50%		100%		100%	100%			88%
Ort 1.3.1	70%	50%		100%	80%	100%	100%			83%
Ort 1.3.2	70%	100%		100%		100%	100%			94%
Ort 1.3.3	30%	50%		100%		100%	100%			76%
Ort 1.3.4	0%	0%		0%		0%	0%			0%
Ort 2.0	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
Ort 2.1	80%	50%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%
Ort 2.2	80%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
Ort 2.3	0%	0%		65%	80%	5%	5%	5%	5%	21%
Ort 2.4	0%	0%		0%		0%	0%	0%		0%
Ort 2.5	0%	0%		0%		0%	0%	0%		0%
Ort 3.1	50%	100%		100%	100%	100%	100%			92%
Ort 3.2	70%	100%			100%					90%
Ort 3.3	100%	100%		100%	100%	100%				100%
Gesamt	48%	52%	20%	69%	78%	65%	65%	51%	68%	57%
	464.747,06 €	18.424,42 €	36.078,84 €	591.484,66 €	555.814,61 €	53.879,79 €	109.581,86 €	68.329,53 €	27.984,35 €	

Bereich 1. Ohne Erschließungsbeiträge

Ort 1.1 (Dickneweg 0+000 - 0+090)
 Ort 1.2 (Parkplatz 0+146,5 - 0+245)
 Ort 1.3.0 (Angleichungsbereiche Landhausstr.)
 Ort 1.3.1 (Angleichungsbereiche Dickne Nord)
 Ort 1.3.2 (Angleichungsbereiche Messel-/Reichbergstr.)
 Ort 1.3.3 (Angleichungsbereiche Stich zur Teckstr.)
 Ort 1.3.4 (Angleichungsbereiche Teckstr.)

Bereich 2. Ausbauprogramm mit Erschließungsbeiträge

Ort 2.0 (bis Landhausstraße 0+090 - 0+146,5)
 Ort 2.1 (Diegelsberger Str. 0+146,5 - 0+245)
 Ort 2.2 (Diegelsberger Str. 0+245 - 0+458,5)
 Ort 2.3 (Diegelsberger Str. 0+458,5 - 0+637)
 Ort 2.4 (Diegelsberger Str. 0+637 - 0+730)
 Ort 2.5 (Diegelsberger Str. 0+637 - Geb. Nr.40)

Bereich 3. Ableitung Bach ohne Erschließungsbeiträge

Ort 3.1 (Anschluss Wohngebiet)
 Ort 3.2 (Bereich Fußweg)
 Ort 3.3 (Daimlerstr. / Strutstr.)

	Submission (brutto)	Prozent	Baukosten (Brutto) - Stand 10.2020
Tief- u. Straßenbau (m. Parkplatz)	1.188.780,75 €	50%	519.250,31 €
Regenwasser	710.925,66 €	78%	555.814,61 €
Kanal	863.110,67 €	69%	591.484,66 €
Wasser Tiefbau	218.197,98 €	58%	122.209,32 €
Wasser Verlegearbeiten	210.045,77 €	66%	137.566,21 €
Daimlerstr. StraBa+Beleuchtung Verkehrssicherung Zeppelin	157.776,30 €	100%	226.000,00 €
Sigeko			
Gesamt	3.348.837,13 €	64%	2.152.325,11 €

Aufgestellt:
Ebersbach, 01.10.2020
Ingenieurbüro Schädel



