
Quartalsbericht IV/2021

Tiefbau

Stadt Ebersbach




Quartalsbericht TA Ebersbach



1. Ebersbach, Diegelsberger Straße
2. Ebersbach, Büchenbronner Straße
3. Ebersbach, Gottlieb-Haefele-Straße
4. Roßwälden, Wellinger Straße
5. Bünzwangen, Unterer Wasen



1.1 Diegelsberger Straße, Lageplan

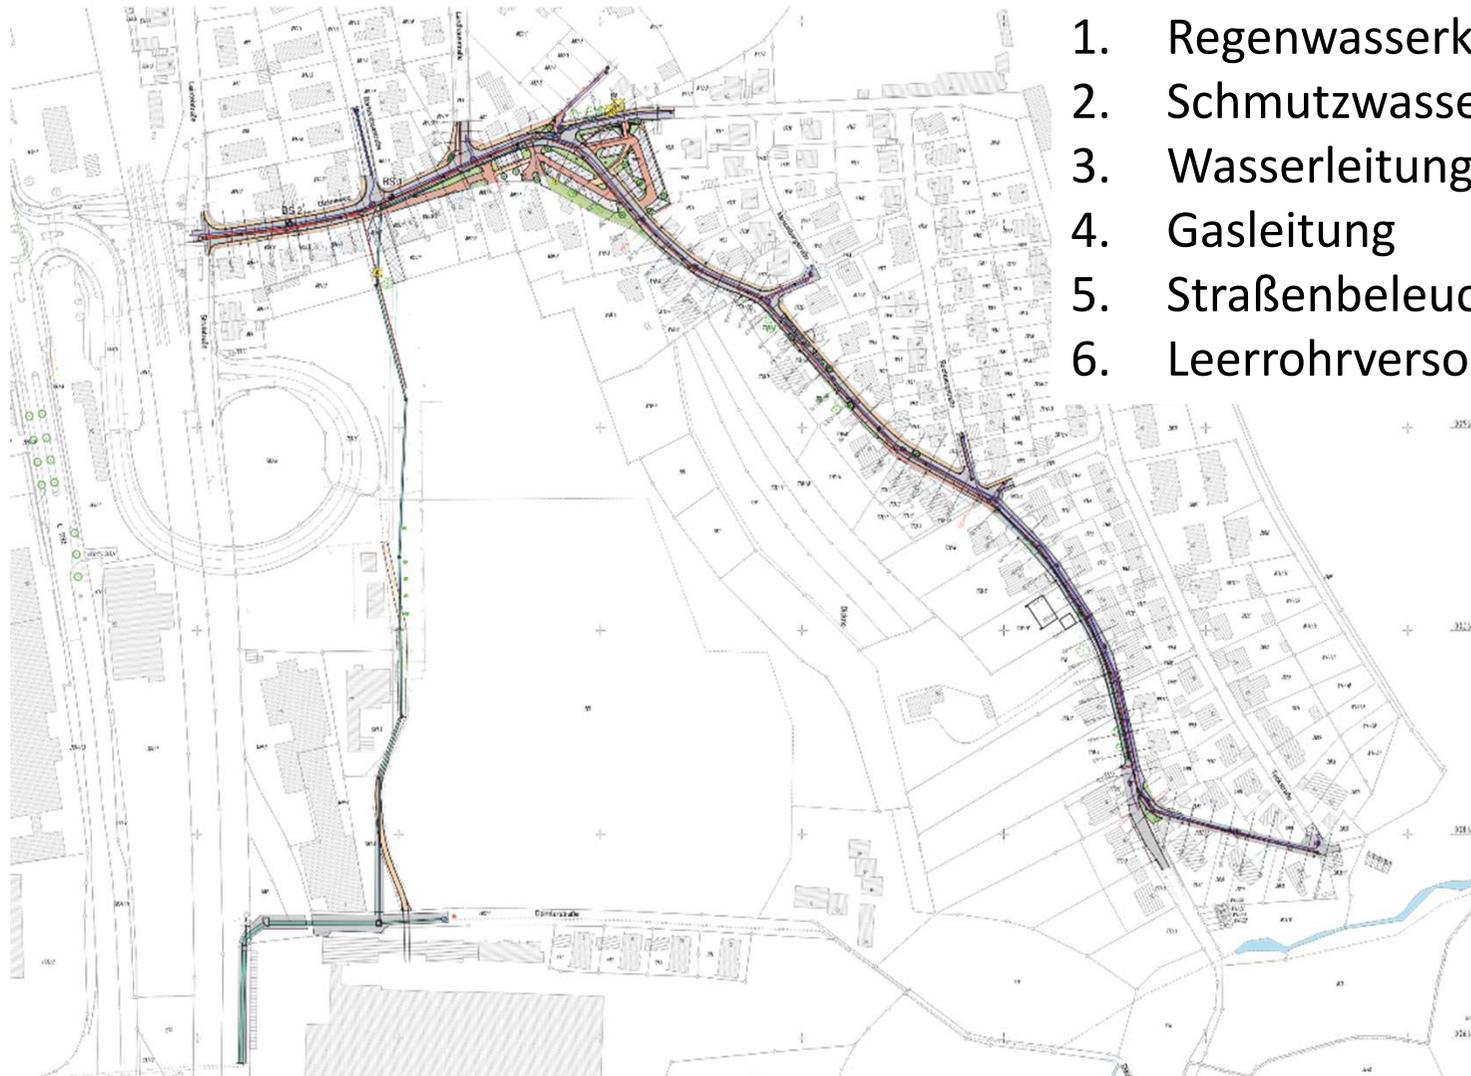

1. Regenwasserkanal
2. Schmutzwasserkanal
3. Wasserleitung
4. Gasleitung
5. Straßenbeleuchtung
6. Leerrohrversorgung Telekom



1.2 Diegelsberger Straße, Überraschungen



Zusätzliche Arbeiten

1. Einmündung Daimlerstraße
2. Wasserleitung Barbarossastraße
3. Wasserleitung Dickneweg Messelbergstraße
4. Wasserleitung priv. Hausanschlüsse
5. Kabelarbeiten (Tieferlegung / Leerrohr / Netze-
BW)
6. Gasleitung Erneuerung Rechbergstraße bis
Teckstraße
7. Zisterne Parkplatz
8. Einlaufbauwerk Freibadbach



1.3 Diegelsberger Straße, aktuelle Bilder



Restarbeiten:

- Private Hofflächen
- Fasung Randsteine
- Einlaufbauwerk Kroatenklinge
- Anpassungsarbeiten Kroatenklinge
- Geländer Parkplatz
- Abrechnung





2.1 Büchenbronner Straße, Lageplan



1. Regenwasserkanal
2. Regenwasserreinigung
3. Schmutzwasserkanal
4. Wasserleitung
5. Gasleitung
6. Straßenbeleuchtung
7. Leerrohrversorgung Telekom





2.2 Büchenbronner Straße, Überraschungen



1. Bestandsgasleitung ohne Sand verbaut -> Austausch der Bestandsgasleitung ca. 50m länger als geplant ->1 Woche
2. Anstehender Fels -> 1 Woche
3. Leitungen der Telekom, Vodafone und Netze-BW liegen zu hoch, Klärung folgt
4. Materialengpässe bei Wasserleitung -> 2 Wochen
5. Kirchhofmauer -> Änderung Bauverfahren

Geplantes Bauende Mitte Mai 2022 derzeit erreichbar



2.4 Büchenbronner Straße, aktuelle Bilder





3.1 Gottlieb-Haeefele-Straße, Lageplan



1. Mischwasserkanal
2. Wasserleitung
3. Netze-BW-Kabelpaket (18 Leerrohre)
4. Straßenbau





3.2 Gottlieb-Haeefele-Straße, Überraschungen



1. Teilweise ausstehende Planung
2. Zusätzliches Leerrohrpaket (18 Stück)
3. Nicht verzeichnete Leitungen (vormals ein Grundstück)

Geplantes Bauende Ende 2022



3.4 Gottlieb-Haeefele-Straße, aktuelle Bilder






4.1 Wellinger Straße, Lageplan



1. Mischwasserkanal
2. Wasserleitung
3. Straßenbau

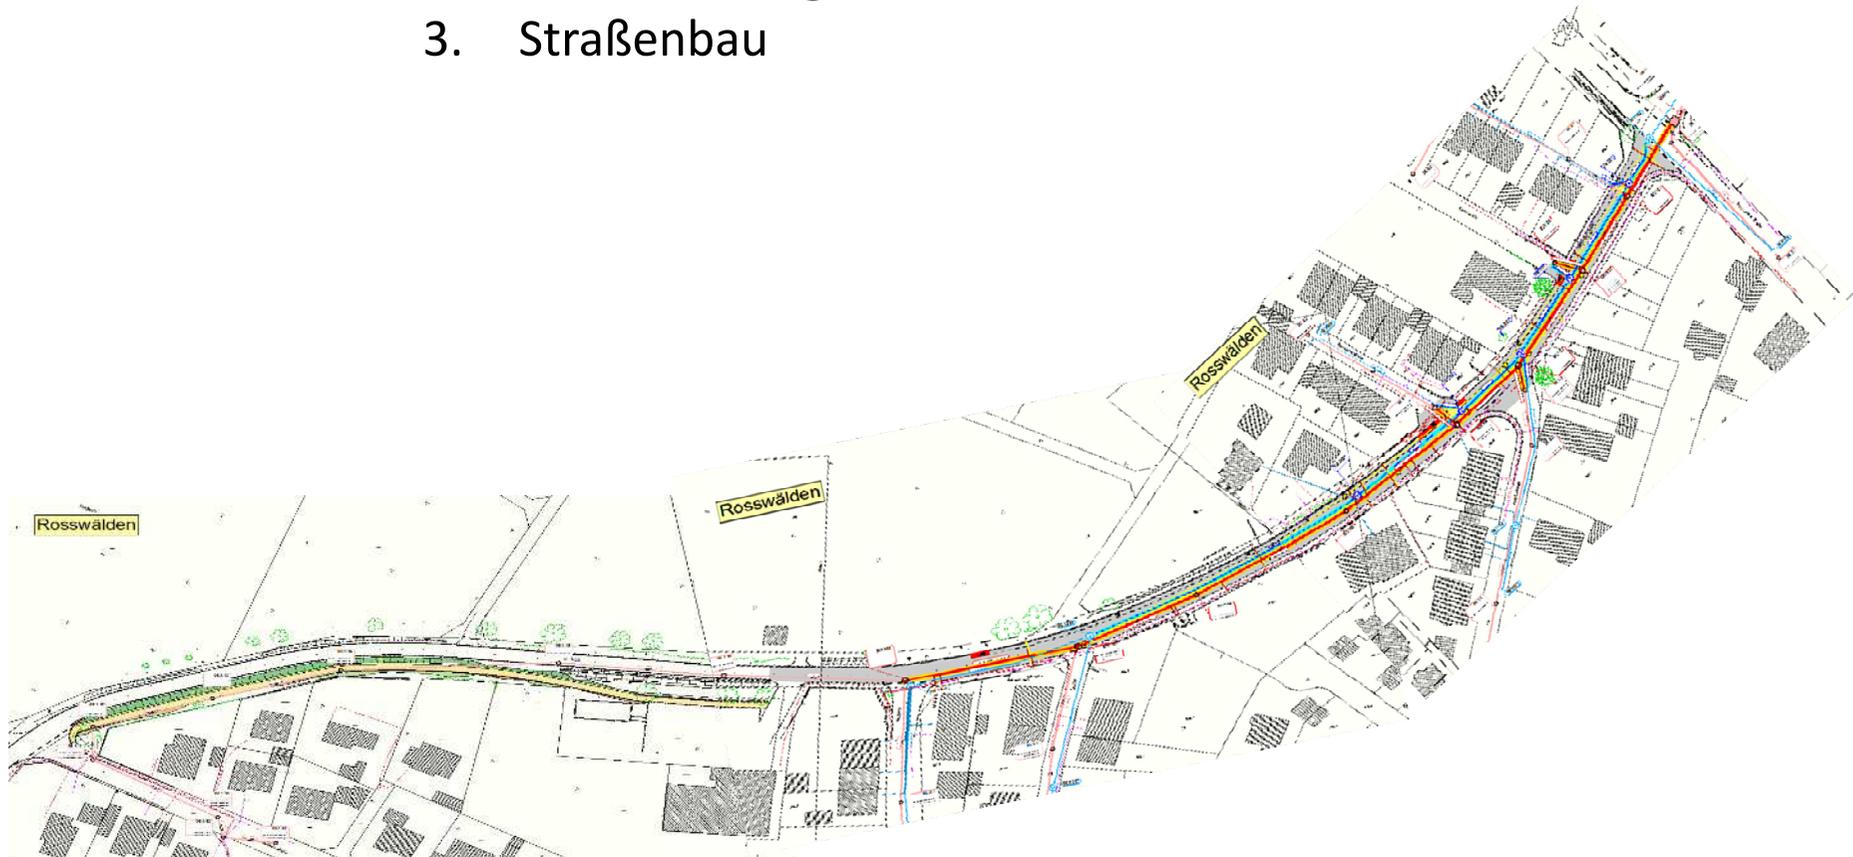




4.1 Wellinger Straße, Regelquerschnitt



Wellinger Straße

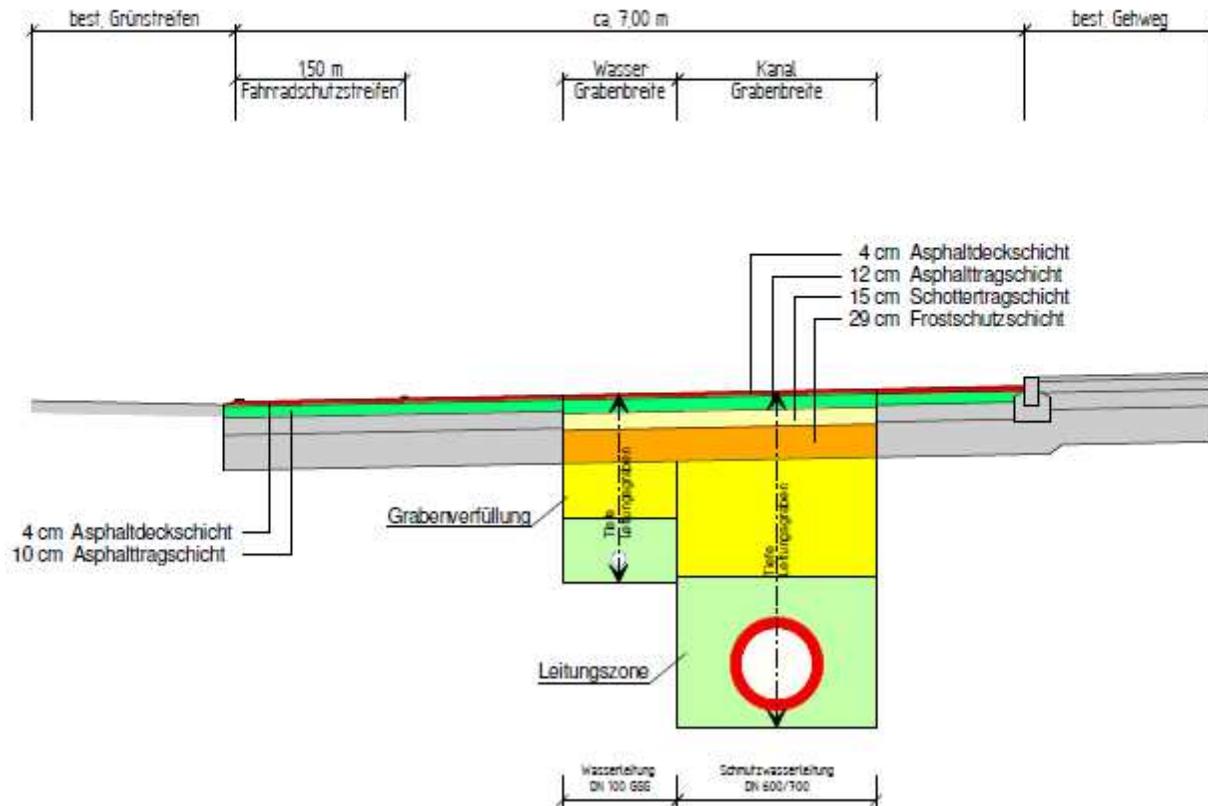



4.2 Wellinger Straße, Überraschungen



Bisher keine



4.3 Wellinger Straße, Zeitplan



Festlegung im Ältestenrat	24.01.2022
Vorstellung der Planung im Ortschaftsrat	10.02.2022
Vorstellung der Planung im ATU	15.02.2022
Vorstellung der Planung im Gemeinderat	08.03.2022
Ausschreibung	11.03.2022
Submission	06.04.2022
Nachrechnung	13.04.2022
Bietergespräch	KW 16 2022
Besprechung Vergabe im Ortschaftsrat	05.05.2022
Besprechung Vergabe im ATU	10.05.2022
Vergabe des Gemeinderats	17.05.2022
Zuschlagsfrist	24.05.2022
Anliegerinformation	Juli 2022
Geplanter Baubeginn (Sommerferien)	01.08.2022
Sperrung K1422 (Sommerferien)	15.08.2022
Geplantes Bauende	Mai 2023




5.1 Bünzwangen, Unterer Wasen, Lageplan






5.2 Bünzwangen, Unterer Wasen

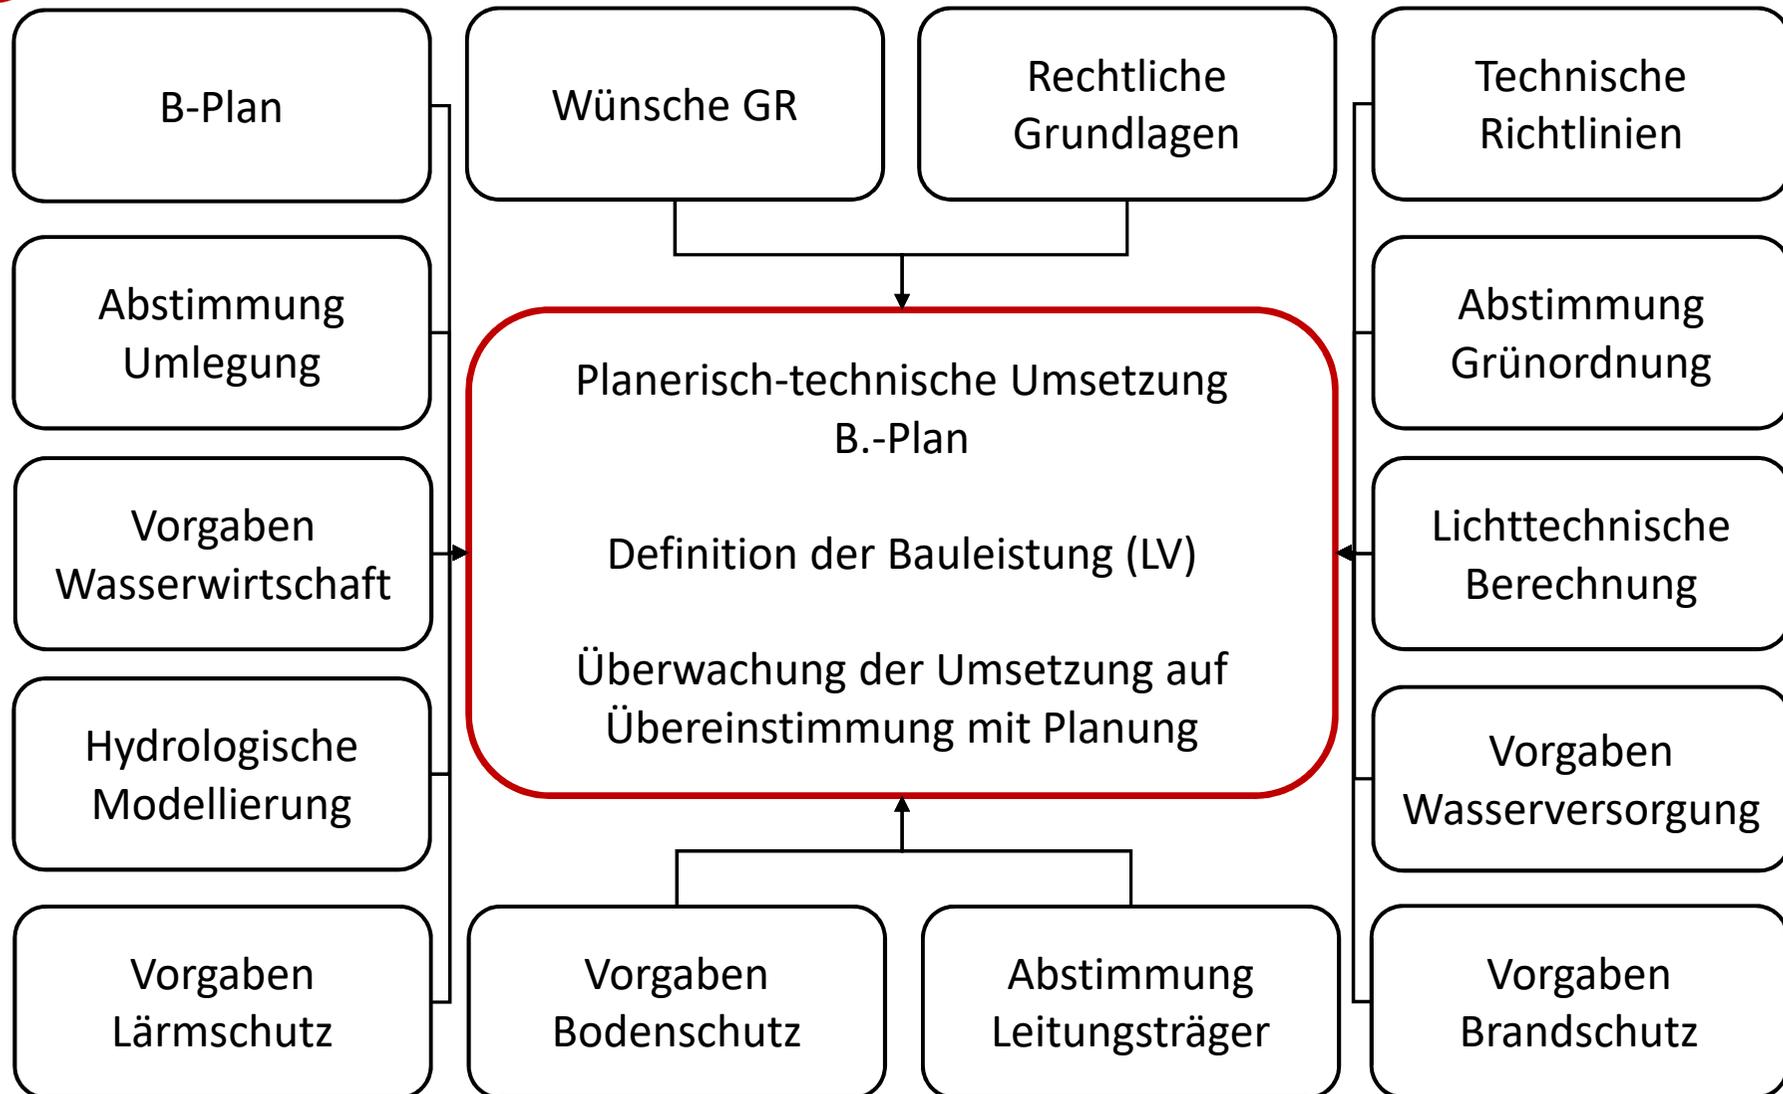



5.2 Bünzwangen, Unterer Wasen

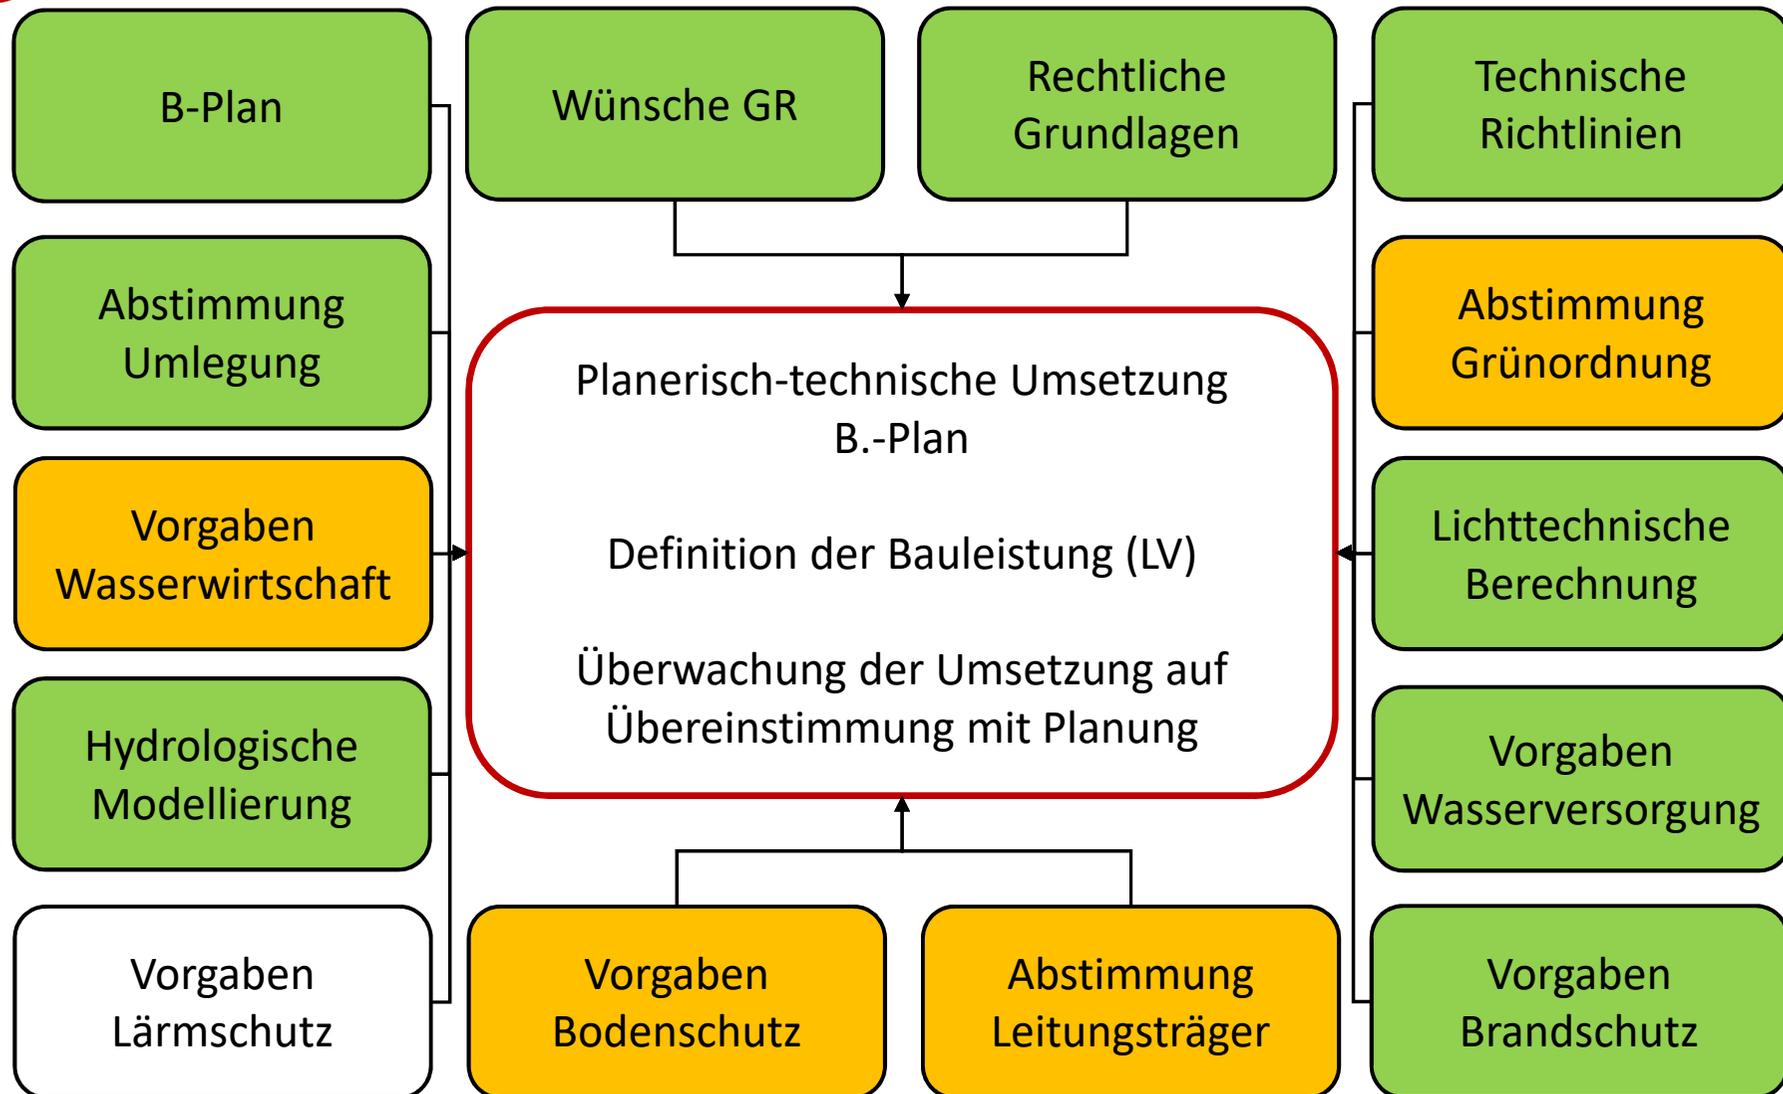



5.3 Bünzwangen, Unterer Wasen, Zeitplan



Abhängig von Genehmigung Wasserrecht!

Festlegung im Ältestenrat	24.01.2022
Vorstellung der Planung im Ortschaftsrat	14.02.2022
Vorstellung der Planung im ATU	15.02.2022
Vorstellung der Planung im Gemeinderat	08.03.2022
Ausschreibung	11.03.2022
Submission	06.04.2022
Nachrechnung	13.04.2022
Bietergespräch	KW 16 2022
Besprechung Vergabe im Ortschaftsrat	09.05.2022
Besprechung Vergabe im ATU	10.05.2022
Vergabe des Gemeinderats	17.05.2022
Zuschlagsfrist	24.05.2022
Anliegerinformation	Juni 2022
Geplanter Baubeginn	20.06.2022
Geplantes Bauende	Ende 2023



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung

Ingenieurbüro Schädel GmbH
Gustav-Seebich-Straße 1
73061 Ebersbach / Fils

T.: 07163 / 16594-0
ebersbach@schaedel.net
